



mijnaansluiting.nl

DSP Workshop - Vaststellen scope Release 1.34.1

27 november 2019

Björn Ampting



Agenda

- Definities releases
- Afgesproken ambitie release 2020
- DSP releaseplanning 2020
- Vaststellen scope: bespreken backlog-items
- Vooruitblik planning 1.34.1: Aanvullende afspraken
- (optioneel) Resterende onderwerpen Procesafspraken





Definities release en impact

Aangescherpte definitie van releases:

Minor: een release is minor als het alleen uitbreidingen van al aanwezige waardenlijsten en het optioneel maken van al aanwezige verplichte velden bevat. Voor een minor zijn geen conversie en aanpassingen van de namespace nodig. Alle DSP releases zijn verplicht: iedere DSP deelnemer dient de minor release in hetzelfde weekend live te zetten.

Major: een release is major wanneer de wijzigingen niet in een minor release passen

Generieke indeling van type change in releases:

Minor (Klein(ere) impact)	Major (Grote impact)
Uitbreiden bestaande waardenlijsten	Nieuwe verplichte velden toevoegen
Optioneel maken van al aanwezige verplichte velden	Verwijderen waarden
	Nieuwe verplichte berichten
	Nieuwe verplichte processtappen
	Optionele nieuwe velden toevoegen
	Nieuwe optionele processtappen / berichten
	Nieuwe disciplines

Nb. De exacte impact is grotendeels afhankelijk van de specifieke inhoud van een change, en dient eigenlijk per change te worden bepaald!





DSP Releaseplanning 2020 – Voorgestelde go-live volgende DSP release op 5 oktober 2020 en aanscherpen afspraken

Met de DSP deelnemers (netbeheerders & aannemers) is in een workshop van 31 oktober j.l. een advies opgesteld voor de releaseplanning 2020:

Ambitie release:

- De duidelijk uitgesproken ambitie voor 2020: release met kleine impact gericht op onderhoud en kleine uitbreidingen. Nadruk om voldoende ruimte en rust te nemen voor uitnutten gebruik huidige versie 1.34.
- Op basis van de huidige planning (inclusief verlate go-live Liander en Cogas 1.34 in Q1 2020) komt het DSP deelnemeroverleg uit op een geplande go-live van de volgende release (1.34.1) op **5 oktober 2020**
- Eventuele grotere wijzigingen worden wel verder uitgewerkt in 2020, maar worden niet eerder dan de release van mei 2021 gerealiseerd.


Aanscherpen afspraken:

- Iedere deelnemer dient in het geplande weekend de release te realiseren. Ook al is een deelnemer niet op tijd klaar (ongeacht van de grootte van de deelnemer): de release gaat altijd door.
- Uitbreiden van monitoring testperioden en bewaking op voortgang: er wordt van iedere partij verwacht dat ze tijdens de geplande testperioden voldoende testactiviteit laat zien.
Bij onvoldoende activiteit: vroegtijdige signalering / escalatie naar DB / Directie Aannemer.





DSP Releaseplanning 2020

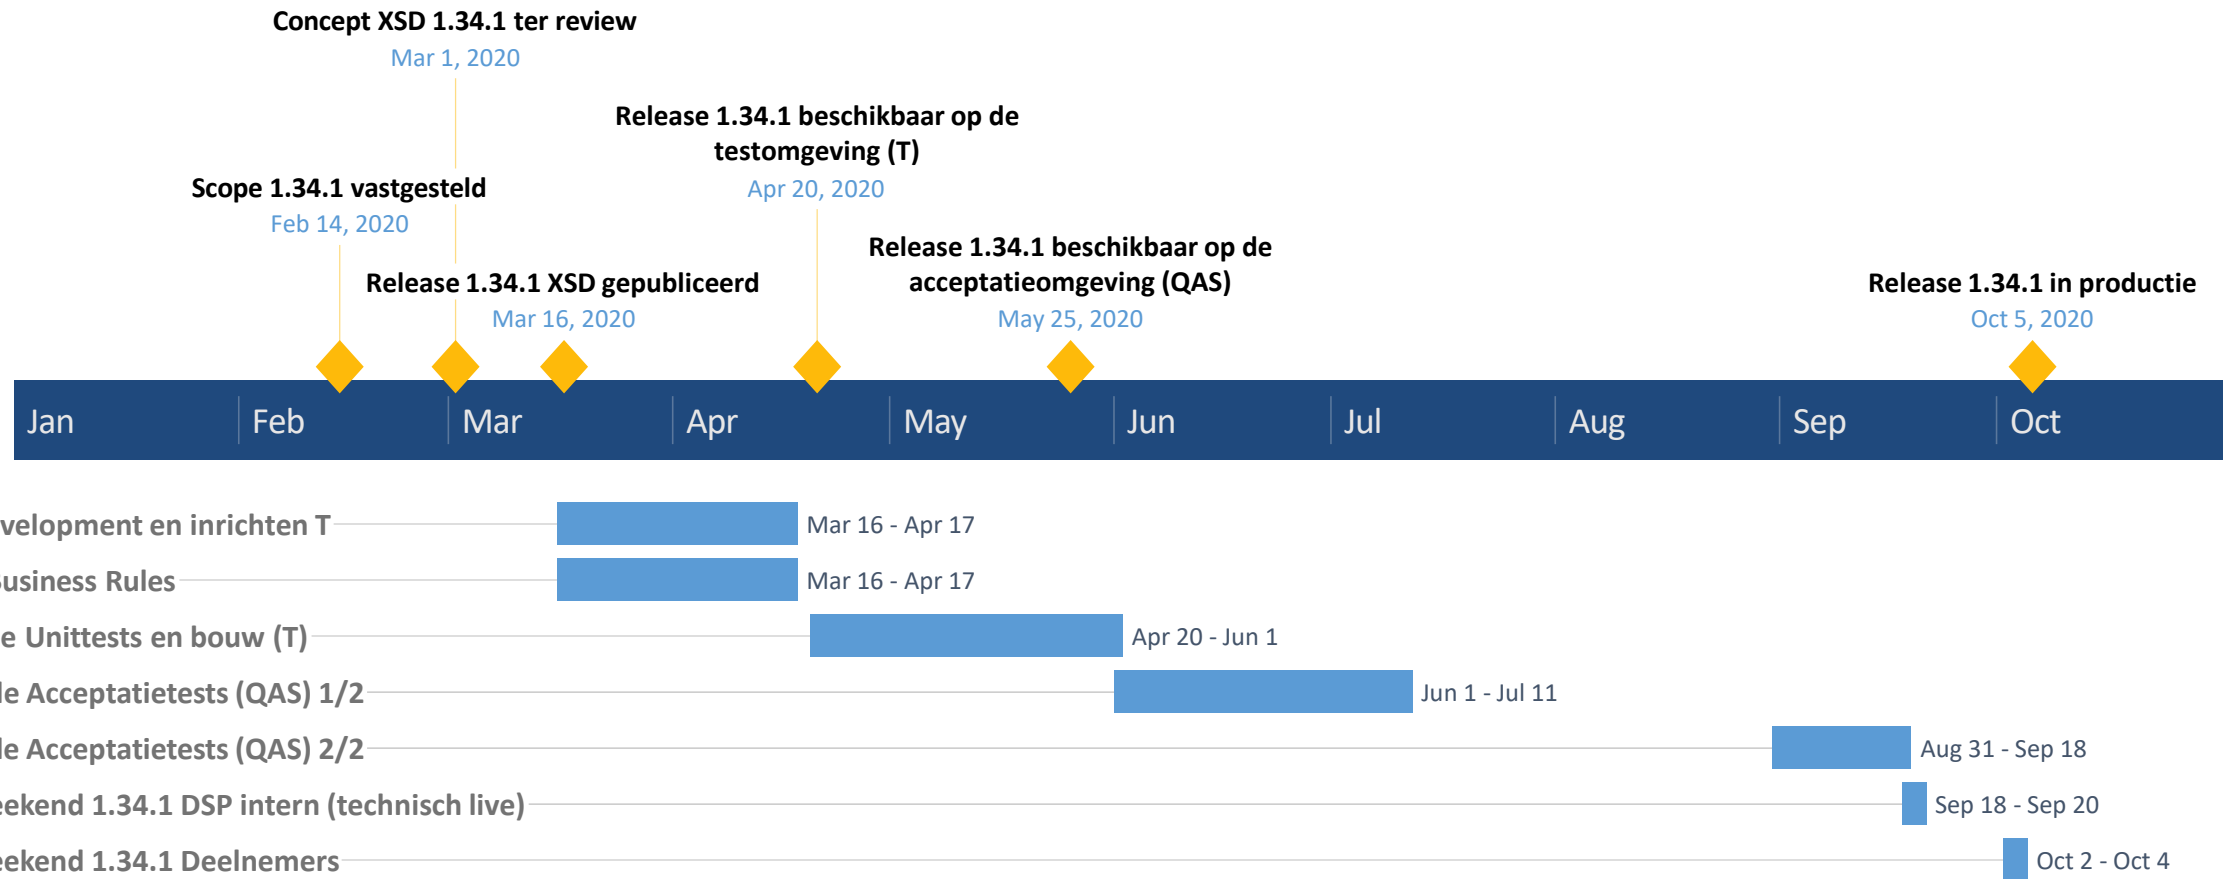



Vaststellen scope 1.34.1: bespreken Backlogitems

- Doel vandaag: scope voor 90+% vastgesteld.
- Bespreke van alle items die als @Minor of @Minor? gelabeld staan op de DSP backlog. Categorieën (van minor naar iets minder minor):
 - Waardenlijst uitbreiden
 - Optioneel maken
 - Veld aanpassen
 - Herschrijven
 - Verwijderen
 - Techniek
- Tot 14-02-2020 nog zéér beperkte ruimte aanwezig voor uitbreiding van deze scope, mits:
 - 'Huiswerk' uit te bespreken items vandaag dat vóór 10-01-2020 afgerond kan worden.
 - Nieuwe @Minor's in de categorie 'hamerstukken'.
- Concept XSD op 1 maart 2020 beschikbaar





Backlogitems – Waardenlijst uitbreiden

Key	Summary	Soort
DSP-2535	Bijstellingsredenen toevoegen 'Bodemonderzoek'	Waardenlijst uitbreiden
DSP-1504	Bijstellingsreden toevoegen - Opdracht onvolledig	Waardenlijst uitbreiden
DSP-2038	CAI - Waarden 25 en 40 toevoegen aan DiameterMantelbuisType in Mantelbuis.xsd	Waardenlijst uitbreiden
DSP-2037	CAI - Waarde HDPE toevoegen aan MateriaalMantelbuisType in Mantelbuis.xsd	Waardenlijst uitbreiden
DSP-2034	Toevoegen Flatkast aan AfnemerEType en AfnemerGType	Waardenlijst uitbreiden
DSP-1531	Toevoegen 'PBA' aan afnemer E	Waardenlijst uitbreiden
DSP-2052	AfnemerGType uitbreiden met de waarde 'Bedrijfspan'	Waardenlijst uitbreiden
DSP-2028	MateriaalAansluitleidingType in AansluitleidingGas.xsd uitbreiden met waarde 'PE32'	Waardenlijst uitbreiden
DSP-1532	Toevoegen waarden G29004; G29005, G29008, G29009 aan TekeningnummerMeteropstelling	Waardenlijst uitbreiden
DSP-1525	Toevoegen 'Bedrijfspan' aan afnemer G	Waardenlijst uitbreiden
DSP-2257	DiameterMantelbuisType waardenlijst uitbreiden 114	Waardenlijst uitbreiden
DSP-2255	DiameterHoofdleidingWaterType waardenlijst uitbreiden met 22, 25, 32, 85, 90, 133, 350	Waardenlijst uitbreiden
DSP-2254	DiameterAanboringType (AanboringWaterType) waardenlijst uitbreiden met 1" x 40 mm	Waardenlijst uitbreiden
DSP-1594	MateriaalHoofdleidingWaterType toevoegen waarden HPE en HDPE	Waardenlijst uitbreiden
DSP-2029	AansluitwijzeElektraType in AansluitingElektra.xsd Secundair splitsen en waardenlijst herschrijven	Waardenlijst uitbreiden





Backlogitems – Optioneel maken & Veld aanpassen

Key	Summary	Soort
<u>DSP-2294</u>	SoortKeerklep optioneel maken onder Watermetertype in AGA optioneel maken	Optioneel maken
<u>DSP-1705</u>	Opdrachtbericht AantalFasenType niet verplichten	Optioneel maken
<u>DSP-2176</u>	Glasvezel AGA - Aansluitkabel verplichting aanpassen voor mantelbuis	Optioneel maken
<u>DSP-2041</u>	Hoofdinfra en Aansluitkabel onder AansluitingCAIAGType optioneel maken voor mantelbuis	Optioneel maken
<u>DSP-2253</u>	Verwijderen of optioneel maken Bescherming in Opdracht en AGA (AansluitleidingWaterType)	Optioneel maken
<u>DSP-2252</u>	Verwijderen of optioneel maken wanddikte in Opdracht en AGA (AansluitleidingWaterType)	Optioneel maken
<u>DSP-2033</u>	TG EANcode optioneel maken	Optioneel maken
<u>DSP-2135</u>	Veld Postcode formatting afdwingen 1234AB	Veld aanpassen
<u>DSP-2134</u>	Veld Huisnummer van string naar integer	Veld aanpassen





Backlogitems – Herschrijven, verwijderen, techniek

Key	Summary	Soort
<u>DSP-1605</u>	AlgemeenWaterType.xsd waardenlijst CaliberWaterType aanpassen (Qn verwijderen)	Veldwaarden herschrijven
<u>DSP-2555</u>	DiameterMantelbuisType waardenlijst verwijderen 114,3	Verwijderen
<u>DSP-2053</u>	TekeningnummerMeteropstelling Verwijderen: 43699R; 43702Q; 43703R; 43700R; 43701Q; 43704S	Verwijderen
<u>DSP-2177</u>	Gas AGA - Huisdrukregelaar keuze verbeteren bij geen actie op huisdrukregelaar	Verwijderen/Aanpassen
<u>DSP-428</u>	Uitfaseren ondersteuning voor TLS 1.0 (TLS 1.2 wordt al ondersteund)	Techniek
<u>DSP-1757</u>	Bijlage extensie verplicht maken	Techniek
<u>DSP-2157</u>	Lege strings niet meer toestaan bij verplichte velden	Techniek
<u>DSP-2589</u>	ExterneReferentie afwezig in de berichtenflow AGP na Annulering	Optioneel veld toevoegen
<u>DSP-2463</u>	Check verplichte velden die optioneel kunnen worden?	Optioneel maken





Vooruitblik planning 1.34.1: Aanvullende afspraken

- Iedere deelnemer dient in het geplande weekend de release te realiseren. Ook al is een deelnemer niet op tijd klaar (ongeachte van de grootte van de deelnemer): de release gaat door.
- Enkele weken vóór het releasemoment dienen de deelnemers klaar te zijn met testen. Voor de release van 5 oktober 2020 is dit moment op 20 september 2020 gezet.
- Uitbreiden van monitoring testperioden en bewaking op voortgang: er wordt van iedere partij verwacht dat ze tijdens de geplande testperioden (T en QAS) voldoende testactiviteit laat zien. Bij onvoldoende activiteit: vroegtijdige signalering en/of escalatie naar DB/Directie Aannemer.
- Voor de release 2021 wordt er tooling gerealiseerd om de business rules te beheren. Een eerste versie hiervan zal naar verwachting vóór zomer 2020 beschikbaar zijn. Voor release 2020 worden de business rules gedeeld door de bestaande Excel aan te passen.
- Voor calamiteiten wordt een uitwijkweekend ingepland: Voorstel 4 weken na de geplande release: Voor release 1.34.1 op 5 oktober 2020 is het uitwijkmoment 2 november 2020. Voor Release 1.35 wordt het uitwijkmoment 21 juni 2021.
- ‘Alles live of niets live’ bij Stedin en Enexis: nadenken om hier flexibiliteit in te bouwen (iig 1.35)





Resterende onderwerpen Procesafspraken

Key	Summary	Soort
<u>DSP-2136</u>	Blokkeren lege bijlagen 0kb	Uniformeren proces
<u>DSP-2589</u>	ExterneReferentie afwezig in de berichtenflow AGP na Annulering	Uniformeren proces
<u>DSP-338</u>	Uitsluitend ASCII-tekens toestaan voor gegevens van bijlagen	Uniformeren proces
<u>DSP-2136</u>	Blokkeren lege bijlagen 0kb	Uniformeren proces
<u>DSP-215</u>	Reduceren variatie - Aantal opdrachten bij activiteit wederinvoer	Uniformeren proces
<u>DSP-2532</u>	Uniformeren gevraagde informatie in element verwijderd meter in TG	Uniformeren proces
<u>DSP-2530</u>	Geen plannings delen naast de DSP planberichten	Uniformeren proces
<u>DSP-1417</u>	Procesafspraken over te gebruiken uitvoeringsdatum voor KPI monitoring	Uniformeren proces
<u>DSP-361</u>	Afspraak over gebruik standaard coördinatie stelsel (GPS/RD)	Uniformeren proces
<u>DSP-219</u>	Reduceren variatie Afspraak gebruik TekeningnummerMeteropstelling en Aansluitpakket	Uniformeren proces
<u>DSP-2640</u>	Afspraak over gebruik lengte stringvelden	Uniformeren proces





mijnaansluiting.nl



DSP Releaseplanning 2021

