



mijnaansluiting.nl

DSP Deelnemersoverleg

17 oktober 2019

Björn Ampting



Agenda

- 1) Mededelingen
- 2) Opgeleverde functionaliteit
- 3) Functionaliteit in ontwikkeling
- 4) Status conversie oude opdrachten
- 5) Releaseplanning 2020
- 6) Workshops
- 7) Hergebruik OpdrachtID's
- 8) Rondvraag





Mededelingen

- Backlog review: al behoorlijk wat input gehad, maar meer = welkom!
- Afgelopen maandag sessie met management van een aantal grote aannemers over ontwikkelagenda DSP.
 - Aangegeven dat er afvaardiging aanwezig is in DSP deelnemersoverleg
 - 8-wekelijkse sessie gepland om deze groep mee te nemen in de ontwikkelagenda.
- Annuleringsproces: aantal verzoeken op opdrachten die een deelnemers zelf te annuleren zijn blijven te hoog.






Opgeleverde functionaliteit: Routing SWV (Samenwerkingsverbanden) en Analytics 1.6

Analytics 1.7.0

- CSV download, in delen, opgebouwd in browser
- Uitgebreid Zoeken - Filter Status 'Open/Alle'
- Uitgebreid zoeken - fix werkbak 'Beoordelen TG' voor 1.33 Water
- Export CSV kolommen postcode en woonplaats toegevoegd

Analytics 2.0

- Uitgebreid Zoeken voor iedereen
- Zoeken op Opdracht Status kan alleen nog op volledig opdracht ID
- Het scherm 'Uitgevallen Opdrachten' is volledig vervallen, deze informatie kan worden verkregen bij uitgebreid zoeken, 'Verwerken Uitval'
- Opdracht Status Overzicht, na zoeken wordt geen lijst meer getoond,
- Downloaden van een CSV kan alleen vanuit Uitgebreid Zoeken
- QAS/TST Verzenden van bijlagen bij vervolgb berichten
- QAS/TST Opdracht Status Overzicht alleen voor test rol
- QAS/TST Opdracht Status Overzicht max 5 entries






Functionaliteit in ontwikkeling

- Vasthouden filter uitgebreid zoeken bij doorklikken details
- Nieuwe DSP Status voor handmatige annuleringen
- Aflevermonitor wordt toevoegd aan Analytics
- Opslaan gebruik veldwaarden Opdracht, TG en AGA voor analyses.

Volgende sprints (onder voorbehoud):

- API voor Deelnemers als aanvulling op export CSV: voorstel: API met aparte call per OpdrachtID
- Schermen voor combi (CAPO)

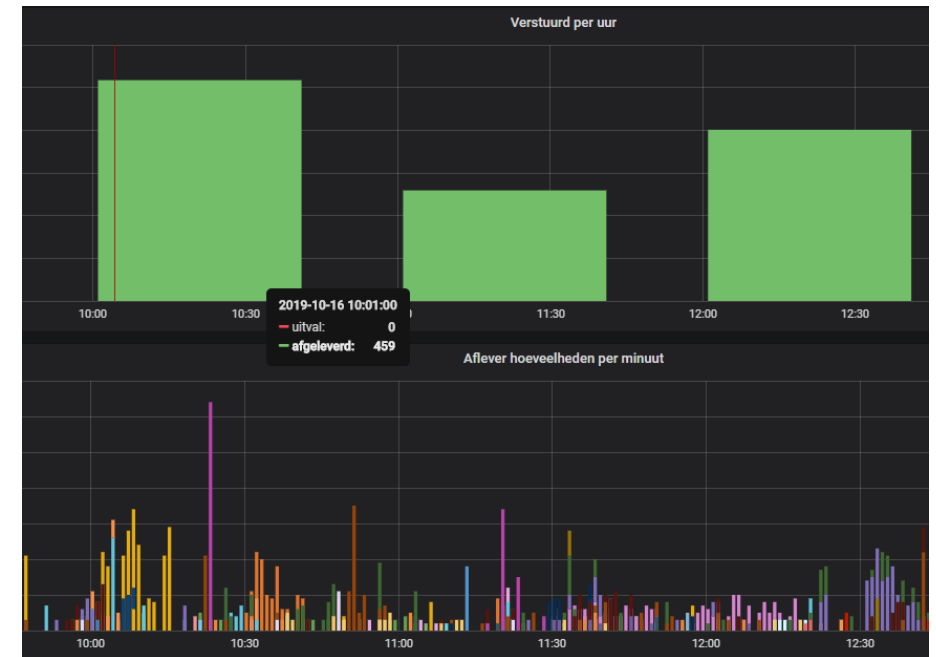



Status Conversie oude opdrachten NB + AN

Cogas	0%
DNWG	100%
Enexis	73%
Evides	84%
Liander	0%
Rendo	88%
Stedin	85%
SynfraNB	52%
Vitens	82%
VWT	0%

AHak	67%
Baas	92%
BAM	58%
Heijmans	64%
Pol	0%
Quint	86%
Siers	92%
Synfra	79%
Van Gelder	82%
Van Voskuilen	81%
Van Vulpen	14%
VdHeuvel	70%
VdSteen	89%
VSH	62%
Eindtotaal	75%


- NB: % van openstaande opdrachten in 1.34
- AN: % van openstaande opdrachten in 1.34 (exclusief Cogas, DNWG, Liander en VWT)
- Nog 18.889 1.33 opdrachten aanwezig (exclusief Cogas, DNWG, Liander en VWT)
- De afgesproken reguliere conversieperiode eindigt op 1 november 2019. Conversie van uitval (in oplevering) eindigt op 1 december

Status van de conversieacties bij de deelnemers?





DSP releaseplanning Q4 2019-Q2 2020

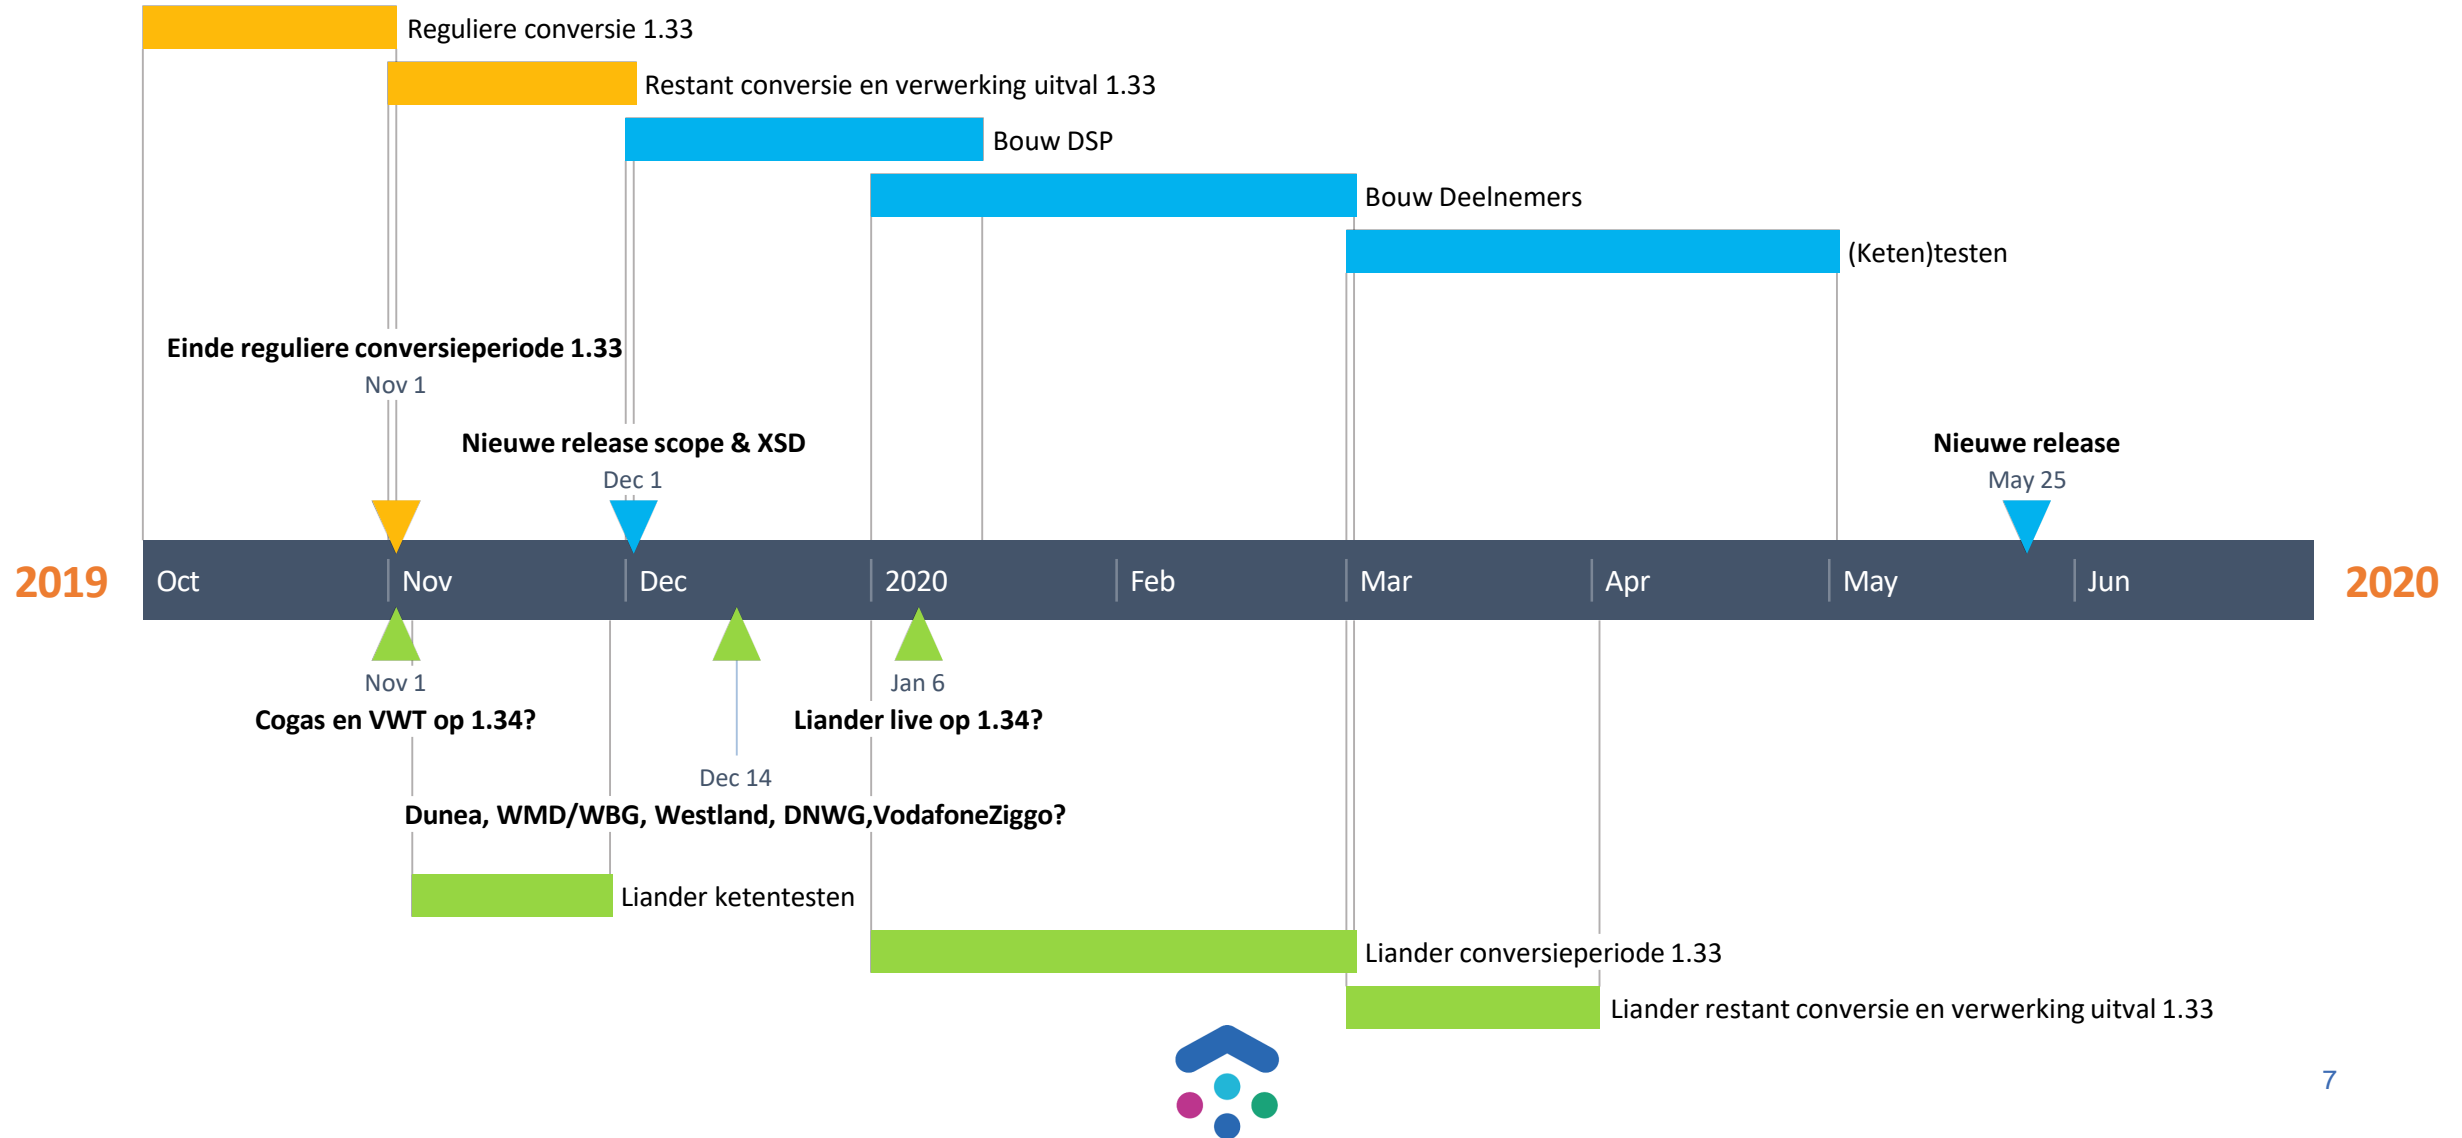



Reacties planningsvraagstuk: 'Welke releaseplanning willen de DSP deelnemers hanteren voor de volgende release?'

- *Wat is de vroegste datum waarop uw organisatie in staat om een 'minor' berichtenrelease te realiseren?
(kleinere onderhoudsrelease met bijvoorbeeld nieuwe optionele velden of toegevoegde waarden in reeds bestaande velden)*
- *Wat is de vroegste datum waarop uw organisatie in staat om een 'major' berichtenrelease te realiseren?
(grotere release met bijvoorbeeld nieuwe verplichte velden)*


Cogas	01-09-20	01-02-21
DNWG	?	?
Enexis	01-10-20	24-05-21
Evides	30-04-20	31-07-20
Liander	01-09-20	24-05-21
Rendo	01-10-20	01-10-20
Stedin	25-05-20	25-05-20
SynfraNB	25-05-20	25-05-20
Vitens	25-05-20	25-05-20
VWT	01-09-20	01-02-21


BAM Infra Energie en Water	14-10-20	14-12-20
Heijmans	?	?
Plaisier	?	?
Pol	?	?
Quint en van Ginkel	01-09-20	25-05-20
Siers	?	24-05-21
StamCo	01-10-20	24-05-21
Synfra	25-05-20	25-05-20
Van Baarsen	25-05-20	01-10-20
Van Gelder	01-07-20	24-05-21
Van Voskuilen	25-05-20	01-12-20
Van Vulpen	25-05-20	25-05-20
VdHeuvel	01-09-20	25-05-20
VdSteen	08-06-20	26-10-20
VSH	?	?





Reacties voorgestelde releasedata deelnemers in de tijd

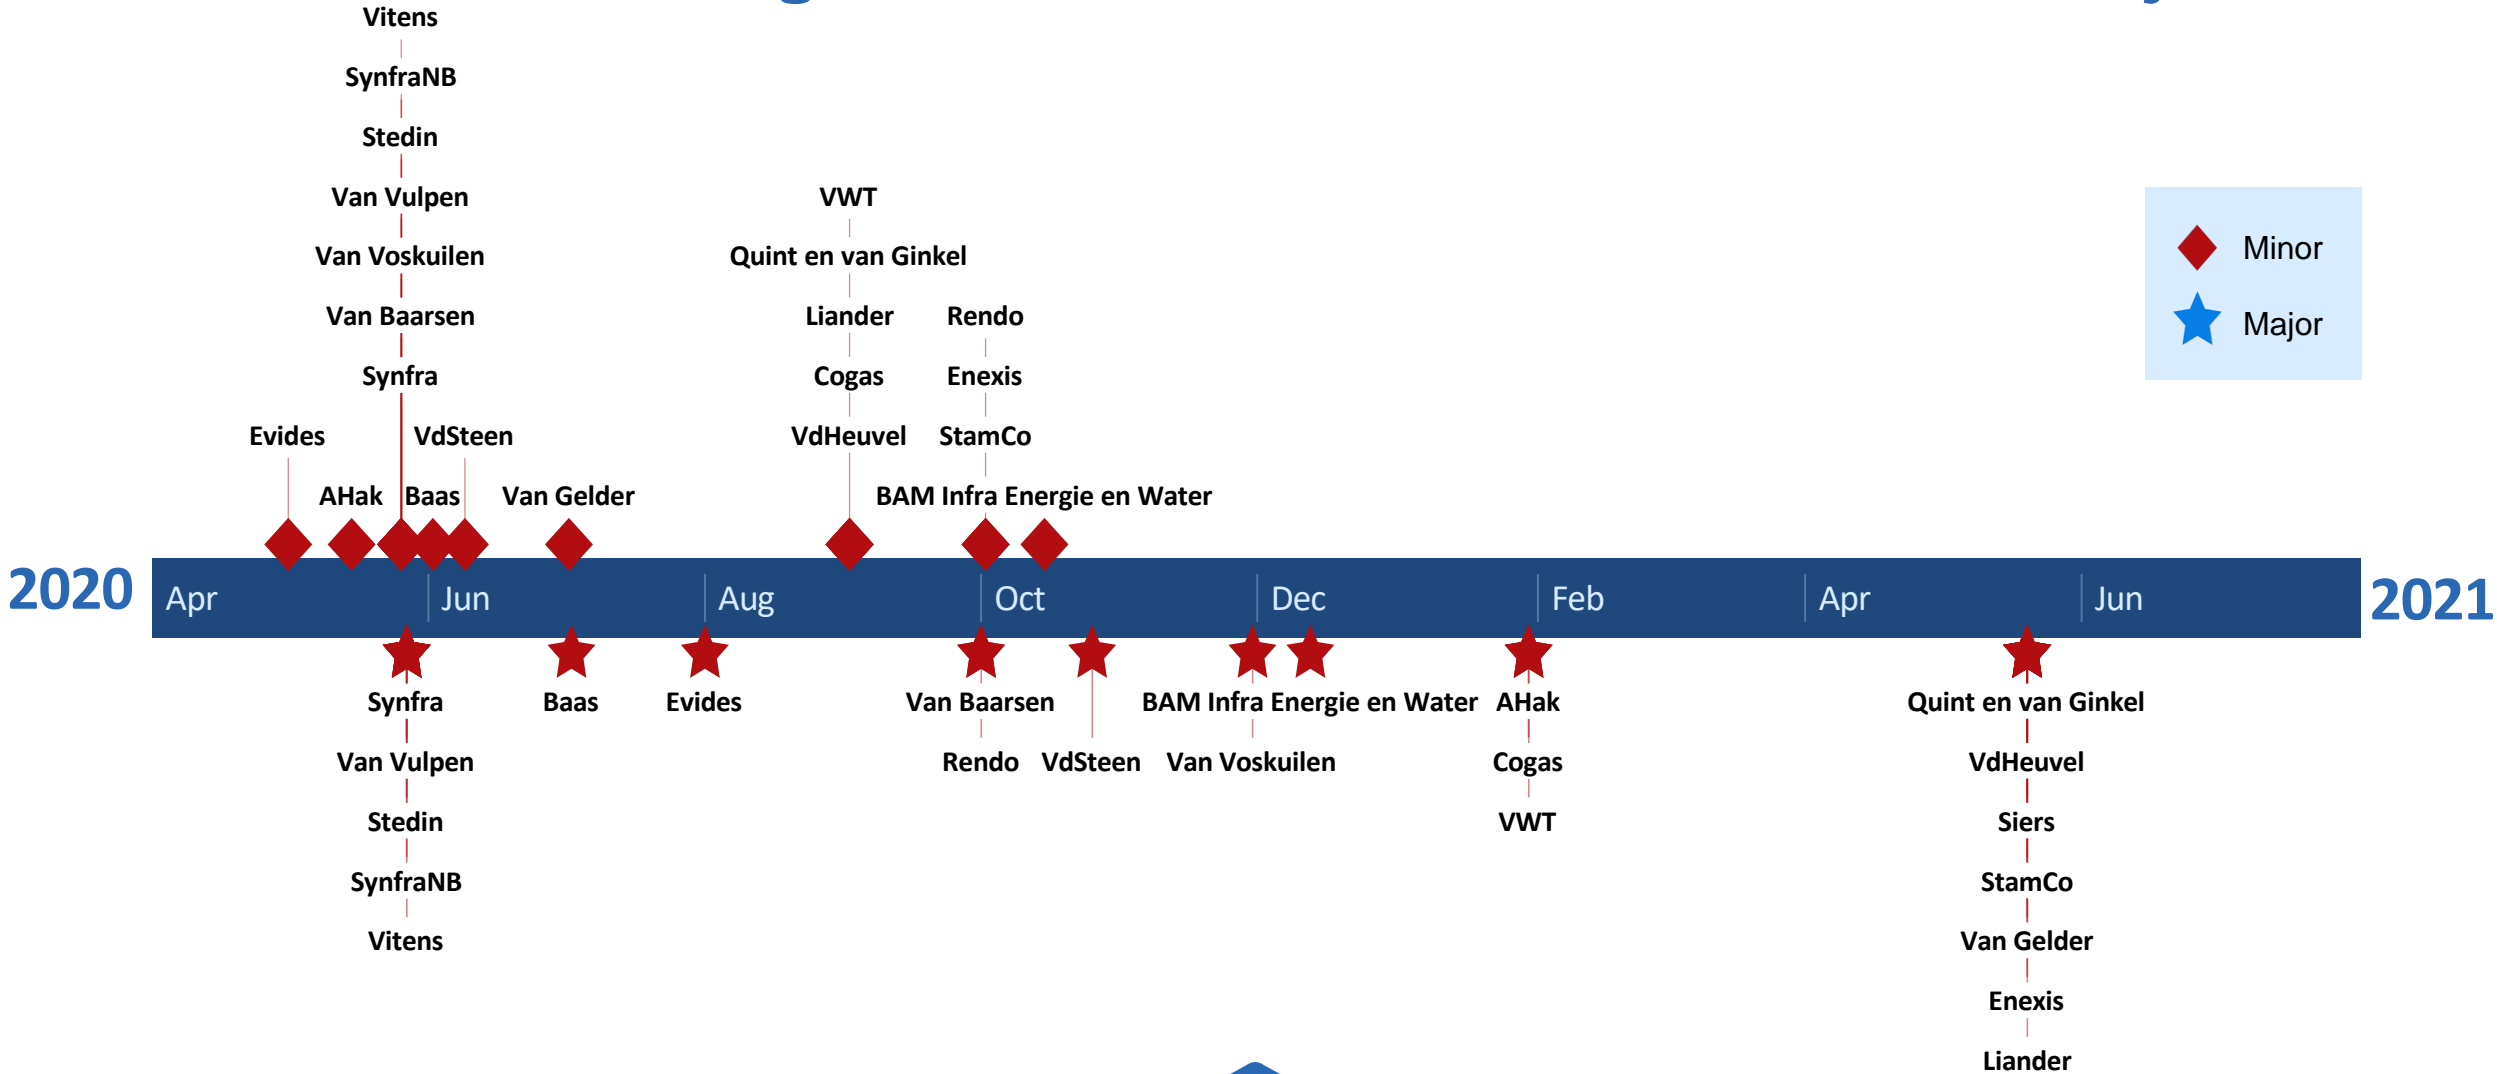

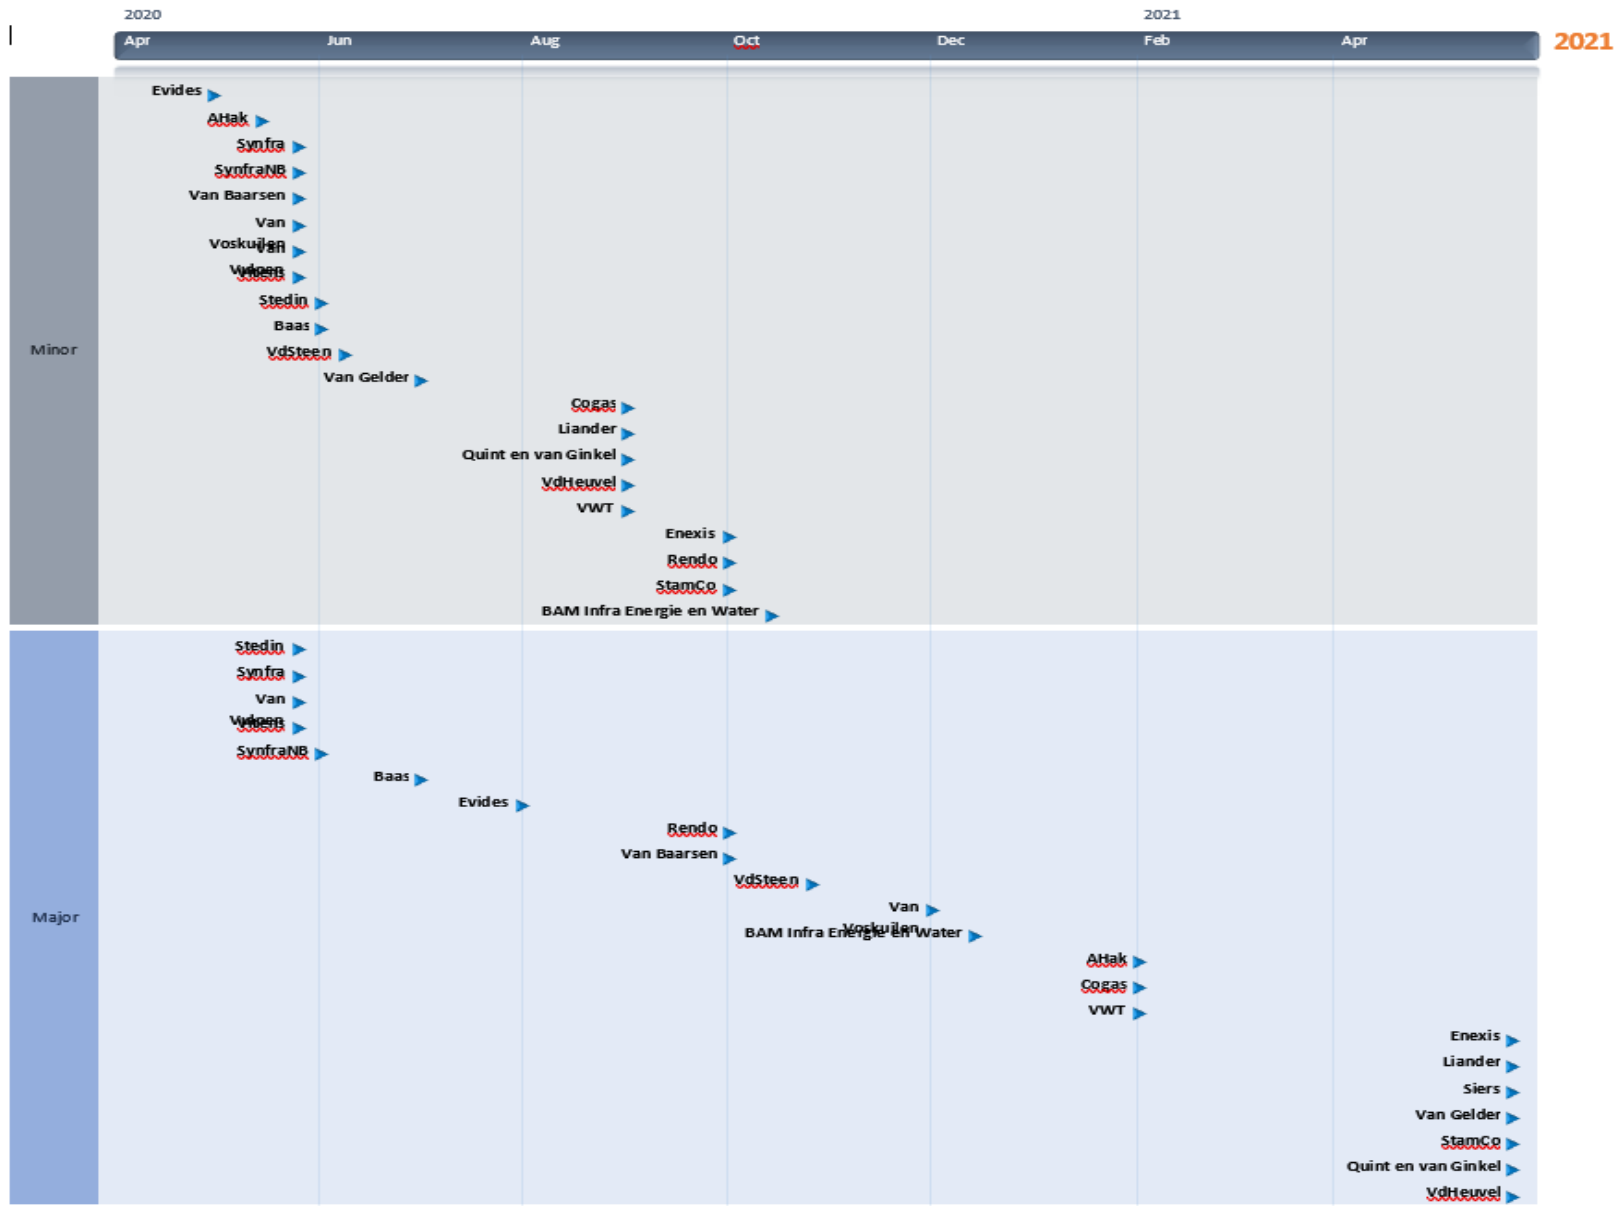



Geplande workshops

31-okt Release

Onderwerpen: Bespreken releasplanning op basis van de terugkoppelingen van deelnemers/bestuur + aanvullende punten uit vervolgdiscussie in deelnemersoverleg van 17 oktober. Verkennen concept scope & afspraken over definitie minor/major.

Doel: Voorstel door deelnemer voor 1) concept-scope berichtenrelease 2) afgestemde releaseplanning voor deze berichtenrelease vanuit de deelnemers 3) meerjarenplanning

13-nov Procesafspraken

Onderwerpen: Bespreken van de items waarvoor wellicht geen aanpassingen in de IT nodig zijn, zie hiervoor de backlog met de items die als 'Procesafspraken' gelabeld zijn.

Doel: Signaleren van verbeterpunten in de processen en opstarten bijbehorende acties.

28-nov (optioneel) Release scope

Afhankelijk van uitkomst 31 oktober

Locatie van de workshops is in Vianen. Aanmelden voor 31-10 of 13-11 kan per mail bij mijzelf.





Hergebruik OpdrachtID's (DSP-2133)

OpdrachtID kan op dit moment hergebruikt worden voor geheel nieuwe (andere) opdrachten. Bij een aantal aannemers levert dit problemen op omdat werkvoorbereiding gelinked wordt aan het DSP OpdrachtID.

Voorstel: niet langer OpdrachtID hergebruiken voor nieuwe/andere opdrachten. Alleen voor bijstellingen toestaan.

Input Van Gelder: eens-

Input Enexis: Dit is toch al een keer afgesproken?

Input A.Hak: Hergebruik Opdracht ID levert probleem op na annulering door netbeheerder en daarna weer opnieuw aanbieden. Kan in ERP systeem niet verwerkt worden zonder software aanpassing.

Input Liander: Liander vind het geen probleem dat een opdracht-ID hergebruikt kan worden. We denken graag mee, impact Liander indien dit wijzigt. Tevens vinden we dat bij conversie het opdracht-ID ook hetzelfde moet kunnen blijven.





Rondvraag





mijnaansluiting.nl



Bijlagen





Status implementatie DSP bij Netbeheerders

NB	Live	Toelichting	# sep-19	# 2019
Liander	√	In alle gebieden	13.438	120.261
Enexis	√	In alle gebieden voor aanvragen <5 lokaties	7.853	73.591
Vitens	√	In alle gebieden voor aanvragen <5 lokaties	1.636	11.912
Stedin	√	Live met 10 aannemers in 3 combi-gebieden	1.183	9.892
Evides	√	In alle gebieden.	485	5.246
Synfra	√	Opdrachten van Brabant Water en WML via Synfra	1.031	4.271
KPN/VWT	√	In alle gebieden	211	2.087
Cogas	√	Met 4 aannemers live	117	1.073
Rendo	√	In alle gebieden	17	354
DNWG Infra	√	Eerste gebied met water en 1 aannemer	8	22
Ziggo	-	Planning eerste gebied start in Q4 2019	-	-
PWN	-	Live 2 ^e helft 2020 (na realisatie nieuw ERP)	-	-
Dunea N.V.	-	Gestart met testen, live Q4 2019	-	-
Oasen	-	Q2 2020 (naast realisatie nieuw ERP)	-	-
WBG	-	Gestart met testen, live Q4 2019	-	-
WMD	-	Gestart met testen, live Q4 2019	-	-
Westland	-	Go-live per januari 2020	-	-
Waternet	-	Na 2020	-	-

